Ž U P A N
KLASA: 340-01/15-01/04
URBROJ: 2125/1-02-15-01
Gospić, 1. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik" br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim

Z A K L J U Č A K

Prihvaćam Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, utvrđujem prijedlog Zaključka i isto dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

Ž U P A N

Milan Kolić, v.r.

Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 340-01/15-01/04
URBROJ: 2125/1-03-15-02
Gospić, 9. travnja 2015. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
- o v d j e -

PREDMET: **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, s mišljenjem Upravnog odjela za gospodarstvo i Izvješćem, dostavlja se**

PRAVNI TEMELJ: Članak 19., 66. i 84 Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
Za izvršenje ovog Zaključka nije potrebno osigurati financijska sredstva.

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 21.b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 3/97, 21/05, 21/09, 22/10 – pročišćeni tekst, 14/13), određeno je da Upravno vijeće ŽUC-a najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Županijskoj skupštini.

Sukladno članku 66. Statuta Ličko-senjske županije, Ličko-senjska županija preko svojih upravnih tijela nadzire rad i brine o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustavova kojima je osnivač ili suosnivač. Ustanove i trgovačka društva obvezne su preko nadležnih upravnih tijela izvještavati najmanje jedanput godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Stoga je Upravni odjel za gospodarstvo izradio mišljenje o zaprimljenom Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, te je izradio i prijedlog zaključka o prihvaćanju istog.

P R O Č E L N I C A

Ana Rukavina – Stilinović, univ. spec. oec.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 340-01/15-01/04
URBROJ: 2125/1-03-15-03
Gospić, 9. travnja 2015. godine

Na temelju članka 66. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst) Upravni odjel za gospodarstvo, a u svezi s zaprimljenim Izvješćem o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Člankom 21.b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 3/97, 21/05, 21/09, 22/10 – pročišćeni tekst, 14/13) - u daljnjem tekstu: Odluka, određeno je da izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: ŽUC) Županijskoj skupštini podnosi Upravno vijeće ŽUC-a najmanje jednom godišnje.

Izvješćem o radu ŽUC-a za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) prikazana je analiza ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode u 2014. godini, analiza rashoda poslovanja ŽUC-a za 2014. godinu te rekapitulacija izvršenja Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta ŽUC-a za 2014. godinu (dalje: Plan).

Realizirani prihodi ŽUC-a u 2014. godini iznose 35.830.258,00 kuna, a realizirani rashodi ŽUC-a za 2014. godinu iznose 35.692.334,00 kune što je 93,8% Plana za 2014. godinu (za pojedine radove i projekte postupak javnog nadmetanja obavljen je krajem 2014. godine pa se završetak određenih radova i dionica planira izvesti u 2015. godini).

Uslijed daljnjeg smanjenja prihoda ŽUC-a temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalni cesta iz sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. za 2014. godinu u odnosu na ranije godine (2012. godini iznosili 50,2 mil. kn), došlo je i do pada ulaganja u radove izvanrednog održavanja te je izvršena asfaltna obnova kolnika najoštećenijih dionica prometno važnijih cesta na području Županije. Tako je u radove redovnog održavanja cesta uloženo 20.706.093,00 od čega su 6.360.516,00 kuna bili troškovi zimske službe. U izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta (uključujući interventne zahvate) uloženo je 4.340.764,00 kuna što je uglavnom na razini ulaganja iz 2013. godini.

Unatoč navedenom, može se zaključiti da je radom ŽUC-a tijekom 2014. godine osigurana protočnost i sigurnost prometa na 1.158 km županijskih i lokalnih cesta u zimskim uvjetima, a nastavljeni su i radovi na razvitku mreže županijskih i lokalnih cesta imajući u vidu stvarne i specifične gospodarsko-prometne prioritete cestovne mreže na području Ličko-senjske županije.

Tijekom 2014. godine Županijska uprava za ceste odradila je i određene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju cesta čime se stvaraju pretpostavke za osiguranje financijskih sredstava, prije svega iz fondova Europske unije.

S obzirom na navedeno predlažemo Županijskoj skupštini usvajanje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2014. godinu.

P R O Č E L N I C A

Ana Rukavina-Stilinović, univ. spec. oec.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 OIB 78697889594
IBAN: HR9023400091100147195

IZVJEŠĆE O RADU
ZA 2014. GODINU

Gospić, ožujak 2015. god.

SADRŽAJ

1.	**PRIHODI……..**	**2**
1.1.	**Analiza ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode za 2014.godinu……**	**2**
2.	**RASHODI…….**	**7**
2.1.	**Analiza rashoda – rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2014.godinu……**	**7**
2.2.	**Analiza rashoda I - troškovi izvršenja radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu…….**	**10**
2.3.	**Analiza rashoda II- troškovi izvršenja radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu……..**	**13**
2.4.	**Analiza rashoda III- troškovi izvršenja programa građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2014.godinu…….**	**15**
2.5.	**Analiza rashoda IV – ostali troškovi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2014. godinu……...**	**16**
3.	**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PLANA ZA 2014. godinu……..**	**17**

1. PRIHODI

1.1. ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA U ODNOSU NA PLANIRANE PRIHODE ZA 2014. GODINU

Razred/ skupina	Pod-skupina	Odje-ljak	Naziv	Plan za 2014. (kn)	OSTVARENO U 2014. (kn)
6			Prihodi poslovanja		
63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna		
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	23.135.520	21.087.155
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6341	**23.135.520**	**21.087.155**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 634	**23.135.520**	**21.087.155**
			UKUPNO ZA SKUPINU 63	**23.135.520**	**21.087.155**
64			Prihodi od imovine		
	641		Prihodi od financijske imovine		
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.000	3.917
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6413	**8.000**	**3.917**
		6414	Prihodi od zateznih kamata	181.910	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6414	**181.910**	**0**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 641	**189.910**	**3.917**
	642		Prihodi od nefinancijske imovine		
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000	28.626
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6422	**27.000**	**28.626**
		6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostale naknade)	12.770.126	12.894.404
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6424	**12.770.126**	**12.894.404**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 642	**12.797.126**	**12.923.030**
			UKUPNO ZA SKUPINU 64	**12.987.036**	**12.926.947**
65			Prihodi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		
	652		Prihodi po posebnim propisima		
		6526	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000	9.912
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6526	**10.000**	**9.912**
		6527	Naknada za dana jamstva	0	4.800
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6527	**0**	**4.800**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 652	**10.000**	**14.712**

			UKUPNO ZA SKUPINU 65	**10.000**	**14.712**
68			Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi		
	683		Ostali prihodi		
		6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave, sufinanciranje s	1.026.001	942.001
			UKUPNO ZA ODJELJAK 6831	**1.026.001**	**942.001**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 683	**1.026.001**	**942.001**
			UKUPNO ZA SKUPINU 68	**1.026.001**	**942.001**
6			**UKUPNO ZA RAZRED 6**	**37.158.557**	**34.970.815**
			VIŠAK PRIHODA	**859.443**	**859.443**
			SVEUKUPNO PRIHODI ZA 2014. GOD.	**38.018.000**	**35.830.258**

PRIKAZ STUKTURE REGISTRIRANIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

a)Tablični prikaz

Kategorija vozila	**2012.** Broj vozila	**2013.** Broj vozila	**2014.** Broj vozila	Omjer broja vozila **2014/2013** (%)	**2014.** uprihodovano (kn)
1 motocikl	430	423	437	**+3,31%**	32.650,00
2 osobni automobil	15.512	15.670	16.012	**+2,18%**	7.131.765,00
3 autobus	60	62	76	**+22,58%**	223.622,00
4 teretni automobil	1.813	1.864	1.911	**+2,52%**	3.961.769,00
5 radno vozilo, priključno vozilo,lake prikolice i poseban slučaj po namjeni vozila	703	665	720	**+1,83%**	1.149.939,00
UKUPNO	18.518	18.684	19.156	**+2,53%**	12.499.745,00

b)Grafički prikaz

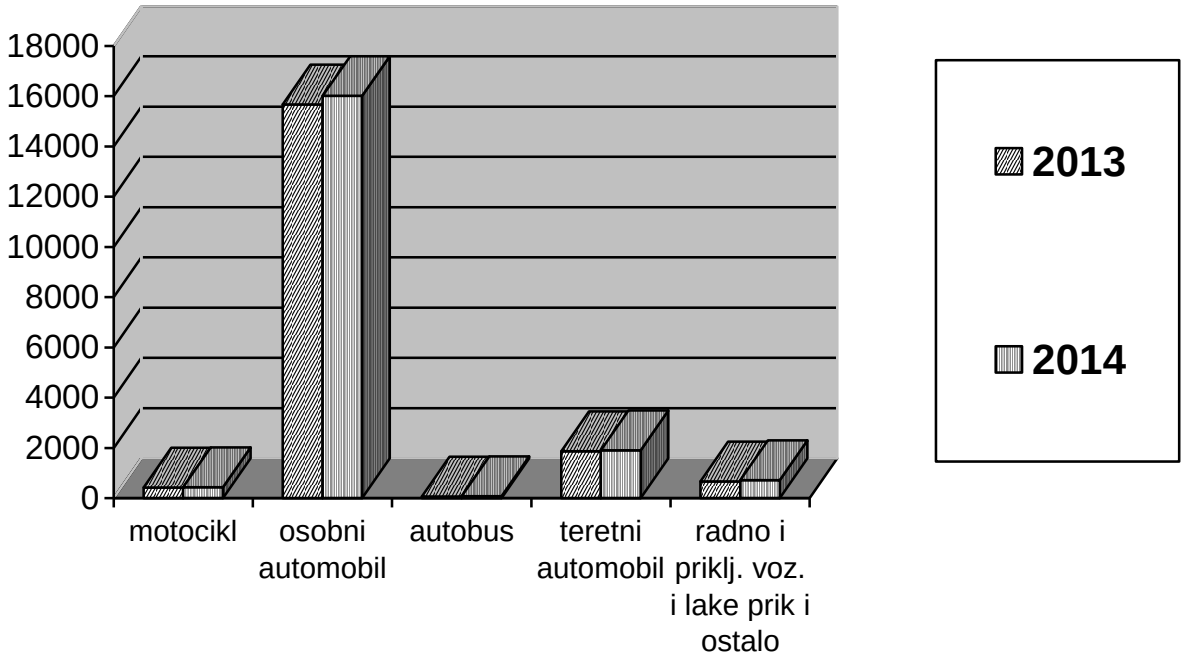

PRIKAZ VISINE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
U VREMENU OD 2007.-2014. GODINE

a) Tablični prikaz

Godina	**Proračun** (sveukupno naplaćeno za proračunsku godinu) u kunama	**Indeks povećanja u %**
2007.	43.949.962,00	-
2008.	45.003.713,00	+2
2009.	40.540.447,00	-10
2010.	57.993.371,00	+43
2011.	54.379.557,00	-6
2012.	50.145.042,00	-8
2013.	37.788.900,00	-25
2014.	34.970.815,00	-7

a) Grafički prikaz

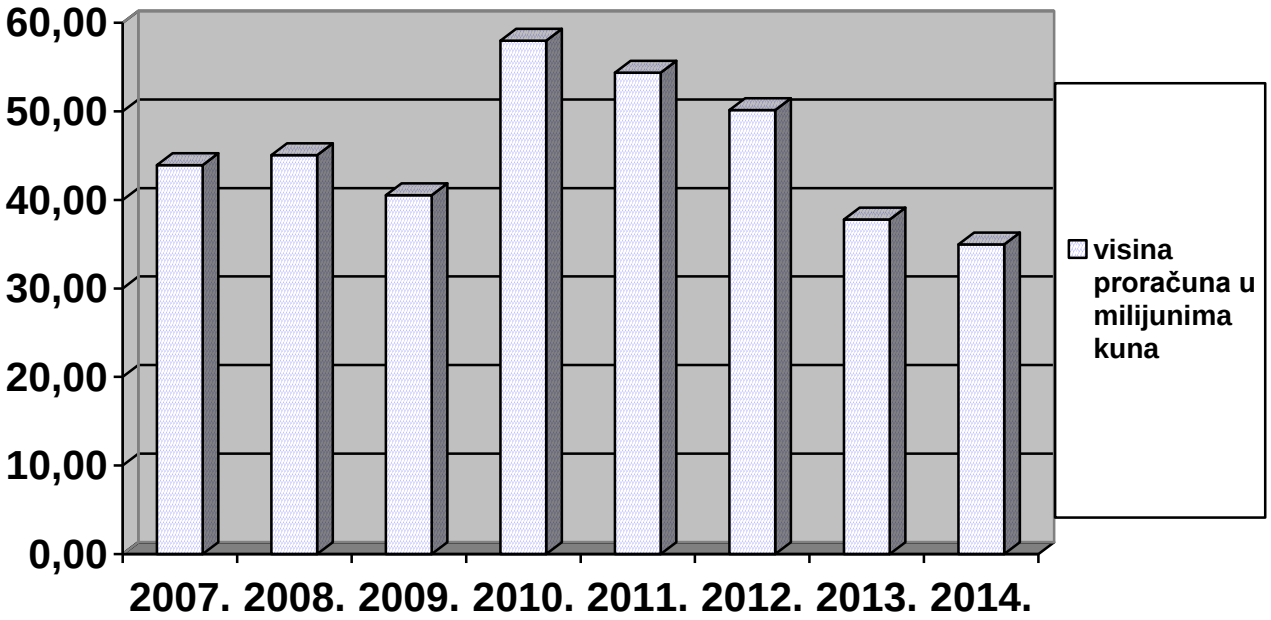

Komentar:

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da ostvareni prihodi u 2014. godini iznose 35.830.258,00 kuna.

Ostvaren je višak prihoda iz 2014. god. u iznosu od 137.924,00 kuna. Višak prihoda su rezervirana sredstva za ugovorene radove iz 2014. godine, a čiji završetak se očekuje u prvoj polovini 2015. godine.

Potraživanja iz 2014. godine iznose 2.284.551,00 kuna, a odnose se na potraživanja od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 2.048.366,00 kuna, potraživanja za kamate u iznosu od 172.264,00 kuna i potraživanja za ugovorene obveze sufinanciranja sa Gradom Novaljom u iznosu od 63.921,00 kuna.

Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2014. godini („Narodne novine“ broj 45/14.), Ličko-senjskoj županiji raspoređen je iznos od 21.000.000,00 kuna. To je zadržavanje istog iznosa kao i 2013. godine, a praktično je smanjenje za 10.000.000,00 kuna u odnosu na prothodna razdoblja gdje je dugi niz godina Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije imala prihod od 31.000.000,00 kuna iz ovog izvora. Naime, u 2013. godini prema spomenutom Pravilniku umanjena su sredstva za Županijske uprave za ceste RH za 120 milijuna kuna. U 2014. godini planirani su prihodi od Hrvatskih cesta u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a ostvareni prihodi iznose 21.087.155,00 kuna.

Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu (NN br.116/14) raspoređen je iznos od 900.000,00 kuna, koji će se realizirati u 2015. godini, jer je Pravilnik donijet pred kraj godine. Prihodi za interventne zahvate iz 2014. godine ostvareni su u iznosu od 74.520,00 kuna.

Od godišnje naknade koja se plaća za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila planirana su sredstva za 2014. godinu u iznosu od 12.300.000,00 kn. Uprihodovana sredstva su 12.444.709,00 kn što predstavlja 144.709,00 kn više od planiranog. Razlog tome jest u činjenici da se u prošloj 2014. godini registriralo 472 vozila više u odnosu na godinu prije, tj došlo je do manjeg rasta stupnja motorizacije u Ličko-senjskoj županiji, u odnosu na prošle godine.

Od ostalih značajnijih sredstava su sredstva koja su u iznosu od 446.245,00 kn uprihodovana temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

Svi ostali prihodi od manjeg su značaja i uglavnom su uprihodovani koliko su i planirani.

Realizacija Financijskog plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini utemeljena je na:

a) suglasnosti na Plan, donijete od strane Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 2. sjednici održanoj 29.11.2013. godine., Klasa: 400-02/13-01/04, Ur.br.: 2125/1-09/13-02-1 a na temelju čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 1/06) i suglasnosti na Program izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana i plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2014. godinu, donijete na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27.11.2014. god., Klasa:400-02/13-01/4, Ur.br.:2125/1-09/13-02-4.
b) Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2014. godini („Narodne novine“ br. 45/14).

2. RASHODI

2.1. ANALIZA RASHODA POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

ZA 2014. GODINU

Razred/ skupina	Pod-skupina	Odje-ljak	Naziv	Plan za 2014. (kn)	Ostvareno u 2014. (kn)
3			**Rashodi poslovanja**		
31			**Rashodi za zaposlene**		
	311		**Plaće**		
		3111	Plaće za redovni rad	1.300.000	1.261.187
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 311	**1.300.000**	**1.261.187**
	312		Ostali rashodi za zaposlene		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	35.825
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 312	**40.000**	**35.825**
	313		Doprinosi na plaće		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.000	189.316
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3132	**180.000**	**189.316**
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.000	21.440
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3133	**22.000**	**21.440**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 313	**202.000**	**210.756**
			UKUPNO ZA SKUPINU 31(rashodi za zaposlene)	**1.542.000**	**1.507.768**
32			**Materijalni rashodi**		
	321		Naknade troškova zaposlenima		
		3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	30.000	23.878
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3211	**30.000**	**23.878**
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000	57.247
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3212	**70.000**	**57.247**
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	6.875
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3213	**5.000**	**6.875**
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.014
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3214	**1.000**	**1.014**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 321	**106.000**	**89.014**
	322		Rashodi za materijal i energiju		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000	30.701
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3221	**46.000**	**30.701**
		3223	Energija (el. energija, motorni benzin, dizel i pelete za grijanje)	100.000	83.475
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3223	**100.000**	**83.475**
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održav.	1.000	814

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3224	**1.000**	**814**
		3225	Sitni inventar i auto-gume	13.000	1.640
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3225	**13.000**	**1.640**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 322	**160.000**	**116.630**
	323		Rashodi za usluge		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000	40.271
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3231	**36.000**	**40.271**
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.302.000	25.537.489
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3232	**27.302.000**	**25.537.489**
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	20.359
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3233	**20.000**	**20.359**
		3234	Komunalne usluge	5.000	4.385
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3234	**5.000**	**4.385**
		3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000	56.705
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3237	**95.000**	**56.705**
		3238	Računalne usluge	50.000	38.400
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3238	**50.000**	**38.400**
		3239	Ostale usluge (naplata naknade za ceste)	160.000	146.731
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3239	**160.000**	**146.731**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 323	**27.668.000**	**25.844.340**
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		
		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	5.507
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3241	**6.000**	**5.507**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 324	**6.000**	**5.507**
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	90.000	87.406
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3291	**90.000**	**87.406**
		3292	Premije osiguranja	20.000	20.601
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3292	**20.000**	**20.601**
		3293	Reprezentacija	20.000	12.418
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3293	**20.000**	**12.418**
		3294	Članarine	32.000	26.232
			KUPNO ZA ODJELJAK 3294	**32.000**	**26.232**
		3295	Pristojbe i naknade	20.000	11.823
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3295	**20.000**	**11.823**
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	11.150
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3299	**15.000**	**11.150**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 329	**197.000**	**169.630**
			UKUPNO ZA SKUPINU 32 (materijalni rashodi)	**28.137.000**	**26.225.121**
34			**Financijski rashodi**		
	343		Ostali financijski rashodi		
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	13.577

			UKUPNO ZA ODJELJAK 3431	**15.000**	**13.577**
		3433	Zatezne kamate	2.000	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3433	**2.000**	**0**
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	640.000	664.184
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3434	**640.000**	**664.184**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 343	**657.000**	**677.761**
			UKUPNO ZA SKUPINU 34	**657.000**	**677.761**
36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg priračuna**		
	363		Pomoći unutar općeg priračuna		
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.581.000	6.570.152
			UKUPNO ZA ODJELJAK 3631	**6.581.000**	**6.570.152**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 363	**6.581.000**	**6.570.152**
			UKUPNO ZA SKUPINU 36	**6.581.000**	**6.570.152**
3			**UKUPNO RASHODI POSLOVANJA**	**36.917.000**	**34.980.802**
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		
	421		Građevinski objekti		
		4212	Poslovni objekti	15.000	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4212	**15.000**	**0**
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	944.000	585.631
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4213	**944.000**	**585.631**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 421	**959.000**	**585.631**
	422		Postrojenja i oprema		
		4221	Uredska oprema i namještaj	75.000	63.589
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4221	**75.000**	**63.589**
		4222	Komunikacijska oprema	4.000	0
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4222	**4.000**	**0**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 422	**79.000**	**63.589**
			UKUPNO ZA SKUPINU 42	**1.038.000**	**649.220**
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000	62.312
			UKUPNO ZA ODJELJAK 4511	**63.000**	**62.312**
			UKUPNO ZA PODSKUPINU 451	**63.000**	**62.312**
			UKUPNO ZA SKUPINU 45	**63.000**	**62.312**
4			**UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.101.000**	**711.532**
			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA ŽUC-e	**38.018.000**	**35.692.334**

2.2. RASHODI I

IZVRŠENJE PROGRAMA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA ZA 2014. GODINU (PO GRUPAMA RADOVA)

Tablica 1

Šifra posla	Pozicija održavanja na županijskim i lokalnim cestama	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
1	2	3	4
1.	**NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA**	**400.000,00**	**378.848,00**
2.	**ODRŽAVANJE KOLNIKA**	**4.500.000,00**	**6.391.336,00**
3.	**ODRŽAVANJE BANKINA I BERME**	**3.000,000,00**	**2.812.722,00**
4.	**ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA**	**250.000,00**	**177.507,00**
5.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU**	**1.000.000,00**	**547.446,00**
6.	**ODRŽAVANJE OPREME CESTA**	**800.000,00**	**775.595,00**
7.	**KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA**	**2.000.000,00**	**1.856.299,00**
8.	**ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, tunela ….)**	**180.000,00**	**183.471,00**
9.	**SUSTAVI, INSTALACIJE,UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA**	**2.000,00**	**131.198,00**
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**	**7.875.000,00**	**6.360.516,00**
11.	**OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE**	**700.000,00**	**1.091.155,00**
	UKUPNO:	**20.707.000,00**	**20.706.093,00**

2.2 RASHODI - I

REKAPITULACIJA
PLANIRANIH I IZVRŠENIH RADOVA NA REDOVNOM ODRŽAVANJU
U 2014. GODINI

Planirani trošak izražen po vrsti održavanja	Plan za 2014. godinu	Izvršeno u 2014. godini
a) Zimsko održavanje (zimska služba)		
I Županijske ceste	3.875.000,00	2.615.788,00
II Lokalne ceste	4.000.000,00	3.744.728,00
Ukupno:	**7.875.000,00**	**6.360.516,00**
b) Ljetno održavanje		
I Županijske ceste	6.832.000,00	7.136.846,00
II Lokalne ceste	6.000.000,00	7.208.731,00
Ukupno:	**12.832.000,00**	**14.345.577,00**
A+B Sveukupno:	**20.707,000,00**	**20.706.093,00**

Komentar:

Redovno održavanje cesta dijeli se na ljetno i zimsko održavanje (zimska služba). Vrijeme trajanja zimske službe u jednoj godini u Republici Hrvatskoj podijeljeno je u dva perioda: od 01.01. do 15.04., te od 15.11. do 31.12., a ljetno održavanje započinje 15.04. i traje do 15.11. tekuće godine.

Trošak zimske službe predstavlja za svaku godinu promjenjivu varijablu, pa radovi ljetnog redovnog održavanja ovise o utrošku sredstava redovnog održavanja u zimskoj službi.

Temeljem članka 33. stavak 4. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11.), i sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11), ŽUC-e je provela otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 4 godine (01.06.2013.g. do 31.05.2017.g.). Nakon provedenog postupka javne nabave ŽUC-e je sklopila okvirni sporazum za nabavu radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od četiri godine, na iznos od 84.997.721,15 kuna s PDV-om sa izvoditeljem radova LIKA-CESTE d.o.o. Gospić, Smiljanska 41.

Planirana ukupna vrijednost radova za 2014. godinu iznosila je 20.707.000,00 kuna, a vrijednost izvršenih radova je 20.706.093,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva za zimsku službu su 7.875.000,00 kn, a sveukupna utrošena sredstva za tu namjenu iznose 6.360.516,00 kn, što predstavlja smanjenje troškaka izazvan povoljnim vremenskim prilikama u zimskom periodu na području Ličko-senjske županije.

Analizom izvršenih radova u 2014. godini na ljetnom redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji zaključujemo da su najznačajnija sredstva uložena u slijedeće stavke:

1. Sanacija asfaltnog kolnika	4.849.653,00 Kn
2. Sanacija kolnika od kamenog materijala	1.541.683,00 Kn
3. Održavanje opreme ceste	775.595,00 Kn
4. Košnja trave i održavanje zelenila	1.856.299,00 Kn

Sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinom kolnika izvršena je na dionicama cesta čiji je kolnik značajno uništen (deniveliranost, raspucalost >50%, opća oštećenost).

Kod održavanja opreme ceste značajnija sredstva utrošena su na zamjenu dijelova (manji broj plašteva) uništene odbojne ograde koja je postavljena u najvećem broju dionica cesta, a značajna sredstva utrošena su na postavljanje vertikalne signalizacije i redovito obnavljanje horizontalne signalizacije.

Kolnik od kamenog materijala redovito je održavan na svim prometno važnijim cestama na području županije.

2.3. RASHODI II

ANALIZA RASHODA II
TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
A)	***Obnova kolnika***		
1.	LC 59001 dionica izlazak Senj L= 2.077 m	968.000,00	966.889,00
2.	LC 59113 dionica Gnjatovići L= 1.150 m	614.000,00	613.236,00
3.	LC 59133 dionica Babić Siča-Zavižan L= cca 2.500 m	1.120.000,00	556.433,00
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA LC	**2.702.000,00**	**2.136.558,00**
1.	ŽC 6274 dionica Stara Novalja L= 1.100 m	1.095.000,00	1.094.478,00
2.	ŽC 5145 dionica Sinac L= 2.215 m	693.000,00	692.612,00
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC	**1.788.000,00**	**1.787.090,00**
	SVEUKUPNO OBNOVA KOLNIKA NA ŽC I LC	**4.490.000,00**	**3.923.648,00**

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
B)	***Postavljanje nove zaštitne odbojne ograde***		
	Postavljanje zaštitne metalne odbojne ograde na ŽC5199, dionica Ledenik *(Radovi ugovoreni, realizacija 01-06/2015.)*	660.000,00	0
	UKUPNO POSTALJANJE NOVE ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE	**660.000,00**	**0**

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
C)	***Ostali troškovi izvanrednog održavanja: Projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje, parcelacijski elaborati i kontrolna ispitivanja***		
	Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl. 26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N.“ br..84/2011.), *točke1-3*		
1.	Izrada tehničke dokumentacije ŽC5166 dionica D 50-Sveti Rok-Obrovac (D 54), tzv. „Majstorska cesta“. Sufinanciranje s ŽUC-e Zadarske županije, Općinom Lovinac i Općinom Jasenice, L= cca 38.000 m	200.000,00	90.000,00
2.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika LC59043 na dionici D 52-Krbavica, L= cca 1.300 m	35.000,00	34.875,00

3.	Geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama, iz prethodnog razdoblja.	85.000,00	61.712,00
4.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na: LC 59001 dionica Senj, LC 59113 dionica Gnjatovići, ŽC 6274 dionica Stara Novalja, ŽC 5145 dionica Sinac iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovornih usluga	42.000,00	2.626,00
5.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148, iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovornih usluga	16.000,00	0
6.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na županijskim i lokalnim cestama iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga za LC 59133, dionica Babić Siča-Zavižan	4.000,00	0
7.	Stručni nalaz-elaborat i obračun izvedenih radova na LC 59133 dionica Babić Siča, iz prethodnog razdoblja.	13.000,00	12.188,00
8.	Usluge kontrolnih ispitivanja asfalterskih radova na ŽC i LC iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga.	49.000,00	37.063,00
9.	Izrada projektne dokumentacije sanacija i prilagodbe raskrižja ŽC5140 sa LC59019 i križanje ŽC5113 sa D23, iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga.	50.000,00	49.312,00
10.	Izrada projektne dokumentacije za raskrižje: -raskrižje ŽC5126 sa LC59133 (Oltari) -raskrižje ŽC5110 sa LC59132 (Veljun) -raskrižje ŽC5166 sa LC59116 (Sv.Rok), iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga.	38.000,00	36.937,00
11.	Usluge specijalističkog pregleda i izrada izvedbene tehničke dokumentacije za sanaciju mosta Plitvice na LC59135, po nalogu Inspekcije za ceste MPPI, iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga.	17.000,00	8.125,00
12.	Izrada prometnog projekta i opreme ceste ŽC 5199 Štirovača (Ž5126)-Šušanj (L59122), L=28,600 km, po nalogu Inspekcije za ceste MPPI, iz prethodnog razdoblja.	70.000,00	70.000,00
13.	Usluga izrade studije i provedba glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za sanaciju mosta Plitvice na LC59135 Poljanak-Plitvica Selo.	29.000,00	14.278,00
14.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova postavljanje zaštitne metalne odbojne ograde na ŽC5199 dionica Ledenik.	12.000,00	0
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	**660.000,00**	**417.116,00**

	SVEUKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE A-C	**5.810.000,00**	**4.340.764,00**

2.4. RASHODI – III

PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
	Troškovi izrade projektne dokumentacije (projektiranje,procjena zemljišta i otkup zemljišta)		
1.	Trošak izvlaštenja na ŽC5167 Udbina – D.Lapac, ostatak izvlaštenja	300.000,00	321.421,00
2.	Usluge procjene zemljišta za postupak izvlaštenja na ŽC 5140 dionica, Švica-Kuterevska Kosa	52.000,00	48.242,00
3.	Trošak izvlaštenja na ŽC 5140, dionica Švica-Kuterevska Kosa	80.000,00	9.198,00
4.	Izrada projektne dokumentacije: -rekonstrukcija ŽC5167 Udbina-D.Lapac, dionica II Kuk-Udbina L=13.000 m, iz prethodnog razdoblja. Završni obračun ugovorenih usluga.	14.000,00	12.838,00
5.	Usluge procjene zemljišta za postupak izvlaštenja na LC 59028, dionica D8-Lukovo	37.000,00	36.431,00
6.	Trošak izvlaštenja na LC 59028, dionica D8-Lukovo	50.000,00	38.476,00
7.	Izrada projektne dokumentacije: -rekonstrukcija ŽC5126, dionica Krasno-Mrkvište, L=23.500 m, iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih usluga.	58.000,00	56.250,00
8.	Izrada projektne dokumentacije: rekonstrukcija ŽC5151, dionica Novalja-D106, L=1.180 m, iz prethodnog razdoblja. Ostatak ugovorenih radova.	48.000,00	27.150,00
9.	Izrada projektne dokumentacije: rekonstrukcija LC59001, dionica Senj (ul. Damira Tomljanovića Gavrana), L=cca 720 m.	75.000,00	35.625,00
10.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste, zajedno s posebnim projektom površinske odvodnje ŽC5143 dionica Otočac-Prozor, L=cca 3.000 m. (*Ugovoreno krajem 2014.godine)*	230.000,00	0
	SVEUKUPNO GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE:	**944.000,00**	**585.631,00**

INTERVENTNI ZAHVATI

Na temelju Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu („NN“ br.91/2013.), od 17.07.2013. godine, Ličko-senjskoj županiji raspoređen je iznos od 136.000,00 kuna za sanaciju nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148.
Ostatak sredstava do visine planiranog troška osigurava Županijska uprava za ceste iz vlastitih sredstava.

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
	Sanacija nadvožnjaka		
1.	Sanacija nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148 L=25,00 m	722.000,00	459.129,00
	UKUPNO INTERVENTNI ZAHVATI	**722.000,00**	**459.129,00**

2.5. RASHODI-IV

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

Red. br.	NAZIV	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
1.	Slivna vodna naknada, takse i troškovi za vođenje naplate naknade za ceste	800.000,00	809.196,00
	UKUPNO:	**800.000,00**	**809.196,00**

REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Red.br.	VRSTA RASHODA	Plan za 2014. (kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
RASHODI – I	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	20.707.000,00	20.706.093,00
RASHODI –II	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	5.810.000,00	4.340.764,00
RASHODI -III	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	944.000,00	585.631,00
RASHODI -IV	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama -slivna vodna naknada i naplata naknade za ceste	800.000,00	809.196,00
RASHODI	Rashodi tekuće pomoći prema Zakonu o cestama-nerazvrstane ceste	6.581.000,00	6.570.152,00
RASHODI	Interventni zahvati	722.000,00	459.129,00
	SVEUKUPNO:	**35.564.000,00**	**33.470.965,00**

3. REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PLANA ZA 2014. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plan za 2014. (Kn)	Izvršeno u 2014. (kn)
	1.	**Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila**	**12.300.000,00**	**12.444.709,00**
	2.	**Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta**		
	2.1.	-za redovno i izvanredno održavanje i građenje	23.135.520,00	21.087.155,00
	3.	**Ostali prihodi**		
	3.1	Prihodi na temelju ugovornih obveza, sufinanciranje s jedinicama lokalne samouprave-sufinanciranja s Gradovima Otočcem i Novaljom	1.026.001,00	942.001,00
	3.2.	Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00	0
	3.3.	Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00	0
	3.4.	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	460.126,00	446.245,00
	3.5.	Naknada za obavljanje pratećih poslova	6.000,00	3.450,00
	3.6.	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	14.712,00
	3.7.	Prihod od kamata	189.910,00	3.917,00
	3.8.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.000,00	28.626,00
	3.9.	Višak prihoda	859.443,00	859.443,00
		UKUPNO PRIHODI:	**38.018.000,00**	**35.830.258,00**
2.	**B) RASHODI**	**O P I S**	**Plan za 2014. (kn)**	**Izvršeno u 2014. (kn)**
	1.	Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	2.454.000,00	2.221.369,00
		-rashodi za zaposlene	1.542.000,00	1.507.768,00
		-materijalni rashodi	738.000,00	572.923,00
		-financijski rashodi	17.000,00	14.777,00
		-rashodi za nabavu proizvodne dugotr. imovine	157.000,00	125.901,00
	2.	Rashod redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta.	20.707.000,00	20.706.093,00
	3.	Rashod izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	5.810.000,00	4.340.764,00
	4.	Rashod građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	944.000,00	585.631,00
	5.	Ostali rashodi	800.000,00	809.196,00
		-slivna vodna naknada i takse	640.000,00	662.984,00
		-troškovi vođenja naplate naknade za ceste	160.000,00	146.212,00
	6.	Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste	6.581.000,00	6.570.152,00
	7.	Rashodi interventnih zahvata	722.000,00	459.129,00
		SVEUKUPNO RASHODI :	**38.018.000,00**	**35.692.334,00**
		UKUPNI PRIHODI	**38.018.000,00**	**35.830.258,00**
		UKUPNI RASHODI	**38.018.000,00**	**35.692.334,00**
		OSTVAREN VIŠAK PRIHODA		**137.924,00**

Grafički prikaz strukture rashoda
Županijske uprave za ceste
u 2014. godini (izvršenje)

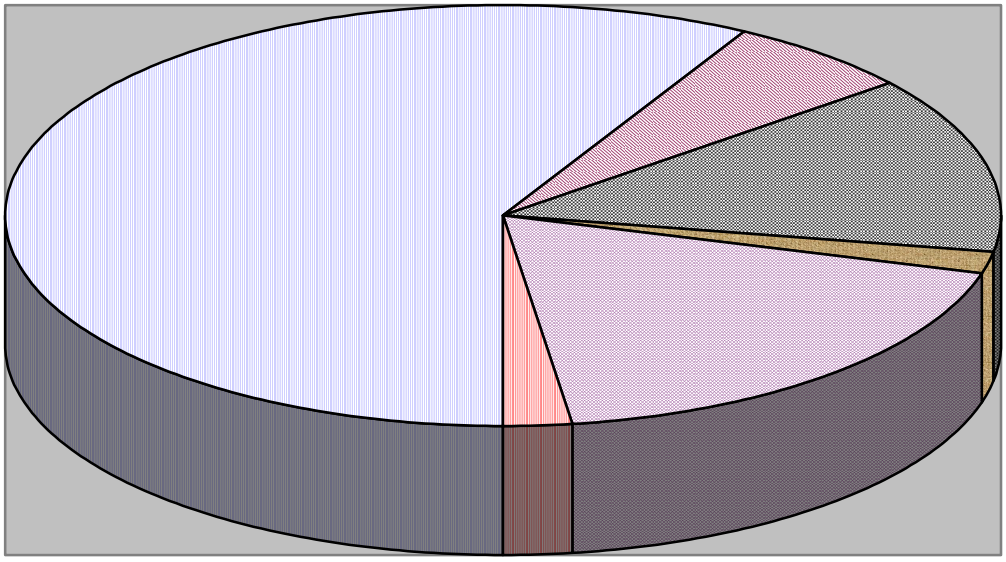

redovno održavanje cesta (58,01%)

rashodi poslovanja Ustanove ŽUC-e (6,22%)

izvanredno održavanje cesta (13,45%)

građenje cesta (1,64%)

rashodi tekuće pomoći prema Zakonu o cestama:Grad Gospić (18,41%)

ostali rashodi- slivna vodna naknada, ostalo (2,27%)

Komentar:

Ostvareni prihodi za 2014. godinu iznose 35.830.258,00 kn, a ostvareni višak prihoda u 2014. godine iznosi 137.924,00 kuna. Za 2014. godinu bilježe se potraživanja u iznosu od 2.284.551,00 kuna, koja se prvenstveno odnose na nepodmirene obveze od strane „Hrvatskih cesta“, i iznose 2.048.366,00 kuna, potraživanja za ugovorene obveze sufinanciranja sa Gradom Novaljom iznose 63.921,00 kuna i potraživanja za kamate u iznosu od 172.264,00 kuna.

Realizirani rashodi za 2014. godinu iznose 35.692.334,00 kune. Za određene radove i projekte postupak javnog nadmetanja obavljen je krajem 2014. godine pa se završetak određenih radova i usluga planira izvesti u 2015. godini.

Iz navedene realizacije vidljiva je uz izvođenje radova i određena aktivnost pripreme projektne dokumentacije na temelju koje se može pronalaziti najprihvatljiviji model financiranja svakog projekta. Priprema projektne dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju cesta je vrlo složen i obiman posao, čija realizacija, kao i proteklih godina, ovisi o nizu subjekata koji sudjeluju u postupku izdavanja pojedinih dokumenata. Hodograme i gantograme takvih projekata vrlo je teško precizirati, pa je i vrijeme trajanja ukupnog ciklusa realizacije dugotrajno.

Završni komentar:

Analizirajući strukturu i količinu radova izvršenih na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije, utvrđuje se pad ulaganja u radove izvanrednog održavanja, što je posljedica značajnog smanjenja prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2014. godini, a koji je Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije financijski najznačajniji prihod. Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije određen je prihod u 2014.godini u iznosu od 21.000.000,00 kn. U skladu sa raspoređenim sredstvima i sa izrađenim prioritetima izvršena je asfaltna obnova kolnika najoštećenijih dionica prometno važnijih cesta na području županije: LC59001 dionica izlazak Senj, LC59113 dionica Gnjatovići, ŽC6274 dionica Stara Novalja i ŽC5145 dionica Sinac. Radovi na sanaciji nadvožnjaka Ličko Lešće na ŽC5148 prema nalogu nadležnog Ministarstva su u najvećem dijelu završeni, a završetak preostalih završnih radova planira se obaviti odmah po završetku zimskog i kišnog perioda u skladu s posebnom tehnologijom i uvjetima propisanim od strane „Hrvatskih željeznica“.

Nastavljeno je kao i prošlih godina kontinuirano ulaganje u mrežu prometnica na području “Parka prirode Velebit”, kroz radove redovnog održavanja. Kroz radove zimskog redovnog održavanja održana je protočnost i sigurnost prometa na 1.156 km županijskih i lokalnih cesta. Izvođenjem radova ljetnog redovnog održavanja sprječava se daljnje propadanje kolničke konstrukcije i osigurava se poglavito opća sigurnost sudionika u prometu.

Važno je da su se bez obzira na velike potrebe, kontinuirano kao i proteklih godina, ali u značajno manjem obimu, nastavili radovi na razvitku i zaštiti mreže županijskih i lokalnih cesta u skladu s raspoloživim sredstvima, imajući u vidu postavljene ciljeve, te stvarne i specifične gospodarsko-prometne prioritete cestovne mreže na području Ličko-senjske županije, i to kroz provedbu:

- općeg redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta (radovi redovnog održavanja), sa posebnim naglaskom na obnovi najkritičnijih dionica kolnika, zamjena dijelova oštećene odbojne ograde, sanacija potpornih zidova, rješavanje odvodnje i slično.
- obnovu kolnika i objekata i modernizaciju makadamskih cesta u cilju postizavanja potpune povezanosti stanovništva županije modernim asfaltnim kolnicima.
- trajnog kvalitetnog rekonstruiranja dionica cesta u urbanim zonama u skladu sa propisanom projektnom dokumentacijom, postizavanje tzv. „uličnog profila“.
- daljnjeg kontinuiranog razvitka tzv.“Velebitskih cesta” u cilju definiranja i revitalizacije osnovne mreže na Velebitu nakon potpunog neodržavanja u proteklih pedesetak godina.
- sustavnog i kontinuiranog ulaganja u cestovnu infrastrukturu koja opslužuje turističke, kulturne i gospodarske destinacije po kriteriju prometne opterećenosti.

Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine, koji je donijela Vlada RH dana 27. prosinca 2013. godine definirana je i posebno naglašena različitost društveno-gospodarske prilika po pojedinim županijama. Specifične okolnosti u pojedinim regijama Hrvatske su vrlo kompleksne i zahtijevaju sustavni pristup definiranju razvojnih potreba u tim regijama. Razvitak

infrastrukture predstavlja preduvjet društveno-gospodarskog razvoja, a u sklopu toga optimalna razvijenost županijskih i lokalnih cesta ima vrlo važnu pokretačku ulogu.
Specifična obilježja pojedinih regija, prema kojima se i razvitak županijskih i lokalnih cesta mora uskladiti, poglavito su:

• područja pogođena ratom koja karakterizira loša poduzetnička aktivnost, gubitak tradicionalnih tržišta, depopulacija i spori povratak stanovništva, specifične poteškoće brdsko-planinskih područja u pogledu geografske i prometne izoliranosti, nemogućnost plasmana roba u modernom tržišnom gospodarstvu, nepovoljna starosna struktura stanovništva i sl.,
• potreba za uravnoteženim održivim razvojem otoka, uvažavajući pri tome prirodnu i kulturnu baštinu s razvojnim potencijalom tih područja što određuje pristup rješavanju prometne politike otoka,
• pogranična područja na kojima treba osposobiti mrežu županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta da mogu opsluživati unutarnje kapacitete, kako bi lokalno stanovništvo s obje strane granice moglo zajednički prepoznati i razviti projekte od interesa za društveni i gospodarski razvitak tih područja,
• područja industrijskih zona i zona malog i srednjeg poduzetništva koja se prostorno i prometno moraju kvalitetno integrirati s tranzitnim prometnim pravcima.

Održivi razvitak cesta zadovoljava potrebe današnjice, a da pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. On osigurava ravnotežu između zahtjeva za unapređenje kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ravnomjeran razvitak zemlje i dobrobit svih žitelja (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnje i buduće generacije (sastavnica očuvanja okoliša). Ulaganja u cestovnu infrastrukturu imaju dugoročan karakter, čiji se efekti, bilo pozitivni ili negativni, odražavaju u dugom vremenskom razdoblju te se strateške odluke o daljnjem razvitku cestovne infrastrukture moraju temeljiti na znanstvenim i stručnim istraživanjima i uzajamnoj suradnji struke i politike.

Obzirom da se kod velikog broja županijskih i lokalnih cesta naše Županije još prilikom davne izgradnje nisu primjenjivali svi potrebni osnovni tehnički uvjeti građenja, u narednim godinama takvo stanje definira ulaganja u neriješene sustave odvodnje, ojačanja kolničke konstrukcije, dogradnju bankina, sanaciju potpornih zidova, propusta i mostova, novu opremu ceste, a u ovisnosti o financijskim sredstvima i pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste, kao i potpune rekonstrukcije u skladu sa prometnim, gospodarskim i društvenim potrebama stanovništva Ličko-senjske županije.

Klasa: 400-01/15-01/02
Ur.br.:2125/1-09/14-02-1
Gospić, 19.03.2015.

Izradio: RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

Predsjednik Upravnog vijeća

Juraj Verzon, dipl.uč.
