ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa:400-01/19-01/02
Ur.broj:2125/1-09/19-02-1
Gospić, 29.03.2019.

01.04.2019
400-02/19-01/05 03
2125/1-09-03-19-01

LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
n/r. gđa. Ana Rukavina Stilinović, dipl.oec.
53000 G O S P I Ć
Dr. F.Tuđmana 4

Predmet: Dostava Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu

Temeljem članka 21.b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 3/97, 21/05, 21/09 i 22/10 – pročišćeni tekst, 14/13 i 29/17), članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije potpuni tekst od 29.03.2018. godine, a na osnovu zaključka donesenog na 5. sjednici Upravnog vijeća dana 29.03.2019. godine, dostavljamo Vam **Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu.

R A V N A T E L J

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.

Dostavljeno:
1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

UPRAVNO VIJEĆE
Klasa:023-01/18-01/02
Ur.br.:2125/1-09/19-02-29
Gospić, 29.03.2019.

Na temelju čl. 21.b Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik" br. 3/97, 21/05, 21/09 i 22/10 - pročišćeni tekst, 14/13 i 29/17), čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (potpuni tekst od 29.03.2018. godine), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 05. sjednici održanoj dana 29.03.2019. donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o donošenju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu

Donosi se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ernest Petry, dipl.iur.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr
IBAN broj: HR9023400091100147195 MB 1335537 OIB 78697889594

IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Gospić, ožujak 2019. god.

S A D R Ž A J

1. PRIHODI..... 4

1.1. Analiza izvršenih prihoda u odnosu na planirane prihode za 2018.godinu..... 4

1.2. Prikaz strukture registriranih motornih i priključnih vozila u Ličko-senjskoj županiji..... 5

1.3. Prikaz visine proračuna Županijske uprave za ceste u razdoblju od 2011.-2018. godine..... 6

2. RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO..... 8

2.1. Analiza rashoda – rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2018.godinu..... 8

2.2. Analiza rashoda I - troškovi izvršenja programa redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu..... 13

2.3. Analiza rashoda II- troškovi izvršenja radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu..... 15

2.4. Analiza rashoda III- troškovi izvršenja programa građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta za 2018.godinu..... 16

2.5. Analiza rashoda IV – ostali troškovi poslovanja Županijske uprave za ceste za 2018. godinu..... 17

3. REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. godinu..... 18

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018.g.

I. OPĆI DIO

Redni broj	Račun prihoda i rashoda	Plana za 2018.	Izvršenje 2018.
1	Prihodi poslovanja	26.395.960,00	33.851.627,00
2	Rashodi poslovanja	35.135.500,00	34.784.974,00
3	**Razlika - višak/manjak**	**-8.739.540,00**	**-933.347,00**

Redni broj	Račun financiranja	Plana za 2018.	Izvršenje 2018.
1	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00
2	Izdatci za otplatu zajmova	0,00	0,00
3	**Razlika - višak/manjak**	**0,00**	**0,00**

Redni broj	Višak prihoda iz prethodne godine	Plana za 2018.	Izvršenje 2018.
1	Preneseni višak prihoda poslovanja	8.739.540,00	8.739.540,00
2	Preneseni manjak poslovanja	0,00	-933.347,00
3	**Razlika - višak/manjak (1-2)**	**8.739.540,00**	**7.806.192,00**

Redni broj	SVEUKUPNO	Plana za 2018.	Izvršenje 2018.
1	**Ukupni prihodi + višak prihoda**	**35.135.500,00**	**42.591.166,00**
2	**Ukupni rashodi i izdatci**	**35.135.500,00**	**34.784.974,00**

1.) PRIHODI

1.1. ANALIZA IZVRŠENIH PRIHODA U ODNOSU NA PLANIRANE PRIHODE ZA 2018. GODINU

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI					**26.395.960,00**	**33.851.627,00**
6				**Prihodi poslovanja**	**26.395.960,00**	**33.851.627,00**
Izvor financiranja: Prihodi JLS i HC						
	63			**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**12.359.608,00**	**19.627.461,00**
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	222.000,00	417.889,00
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	222.000,00	417.889,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.137.608,00	19.209.573,00
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.137.608,00	19.209.573,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici						
	64			**Prihodi od imovine**	**13.808.767,00**	**13.981.724,00**
		641		Prihodi od financijske imovine	6.000,00	385,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00	385,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	13.802.767,00	13.981.339,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.404,00	28.626,00
			6424	Naknada za ceste (godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila) i ostale naknade	13.771.363,00	13.952.713,00
Izvor financiranja: Opći prihodi i primici						
	65			**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama**	**16.000,00**	**28.717,00**
		652		Prihodi po posebnim propisima	16.000,00	28.717,00
			6526	Ostali nespomenutu prihodi	16.000,00	12.717,00
			6527	Naknade za dana jamstva	0,00	16.000,00
Izvor financiranja: Prihodi JLS						
	68			**Kaznene, upravne mjere i ostali prihodi**	**211.585,00**	**213.724,00**
		683		Ostali prihodi	211.585,00	213.724,00
			6831	Prihodi na temelju ugovornih obveza sufinanciranje lokalne samouprave i ostali	211.585,00	213.724,00

PRIKAZ STUKTURE REGISTRIRANIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

a) Tablični prikaz

Kategorija vozila	**2016.** Broj vozila	**2017.** Broj vozila	**2018.** Broj vozila	Omjer broja vozila **2018/2017** (%)	Uprihodovano (kn) za **2018.**
1 motocikl	424	481	518	**+7,69%**	38.849,00
2 osobni automobil	16.901	17.357	17.828	**+2,71%**	8.102.640,00
3 autobus	90	89	106	**+19,10%**	251.584,00
4 teretni automobil	2.097	2.271	2.452	**+7,97%**	3.958.717,00
5 radno vozilo, priključno vozilo, lake prikolice i poseban slučaj po namjeni vozila	874	933	1.048	**+12,33%**	645.560,00
UKUPNO	20.386	21.131	21.952	**+3,89%**	12.997.350,00

b) Grafički prikaz

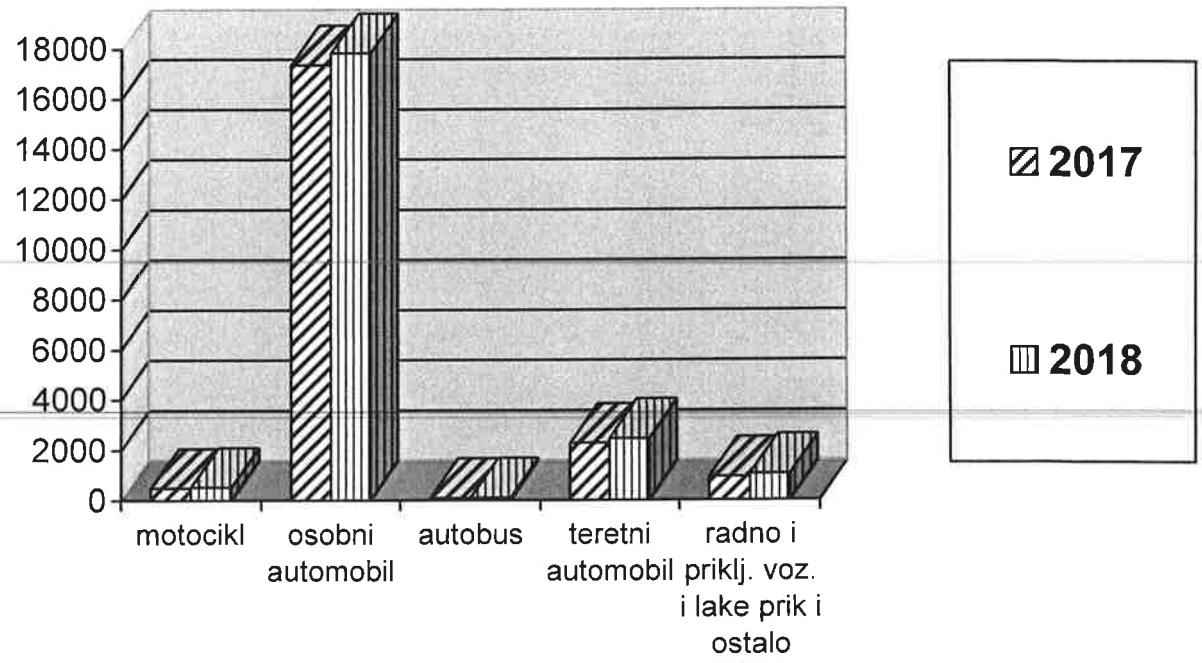

PRIKAZ VISINE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U VREMENU OD 2011.-2018. GODINE

a) Tablični prikaz

Godina	**Proračun** (sveukupno naplaćeno za proračunsku godinu) u kunama	**Indeks povećanja u %**
2011.	54.379.557,00	
2012.	50.145.042,00	-8
2013.	37.788.900,00	-25
2014.	35.830.258,00	-5
2015.	33.817.712,00	-6
2016.	30.194.404,00	-11
2017.	47.126.409,00	+56
2018.	42.591.166,00	-10

a) Grafički prikaz

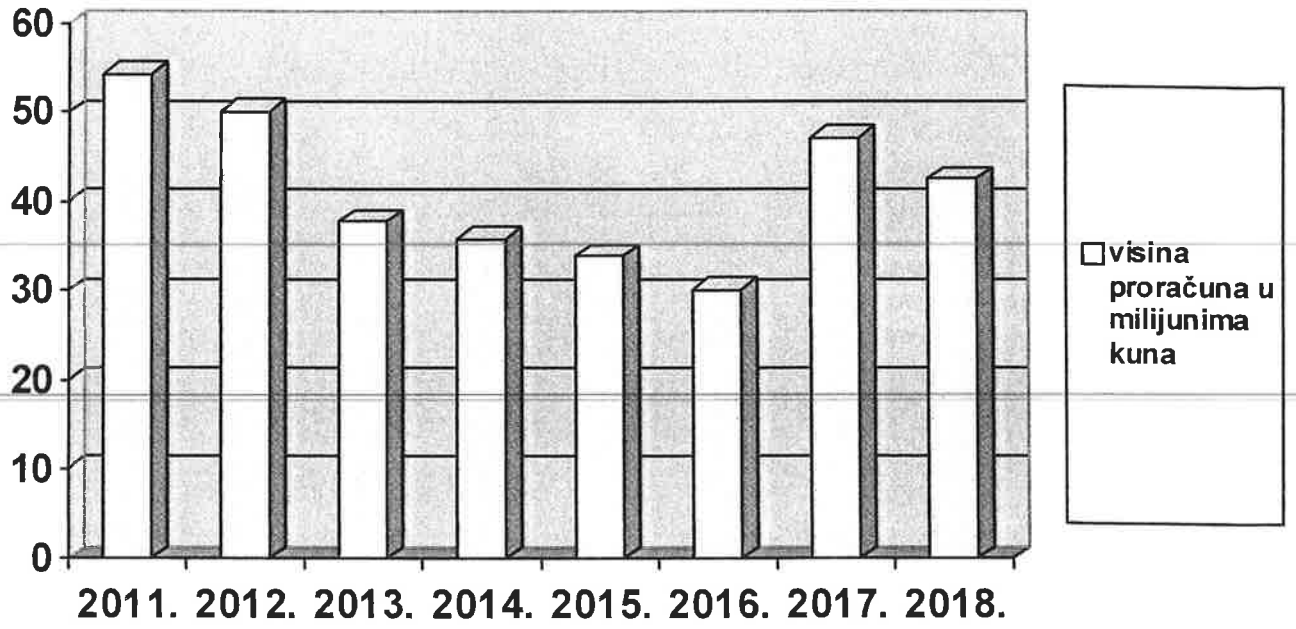

Komentar:

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 33.851.627,00 kuna.

Naplata potraživanja iz 2017. godine odnose se na potraživanja od: Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 1.894.581,00 kuna, sufinanciranja s Općinom Lovinac u iznosu od 211.585,00 kuna i potraživanja za najam prostorija u iznosu od 4.404,00 kuna.

Prihod od Hrvatskih cesta ostvaren je temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 7.643.027,00 kn.

Prihod od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ostvaren je temeljem Odluke o dodjeli sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 9.671.965,00 kn.

Prihodi od sufinanciranja sa lokalnim samoupravama ostvareni su u iznosu od 417.889,00 kn.

Od godišnje naknade koja se plaća za uporabu javnih cesta pri registraciji motornih i priključnih vozila planirana su sredstva za 2018. godinu u iznosu od 12.773.500,00 kn, a uprihodovana sredstva su 12.952.345,00 kn što predstavlja 178.845,00 kn više od planiranog. Razlog tome jest u činjenici da se u prošloj 2018. godini registriralo 821 vozilo više u odnosu na godinu prije, tj. došlo je do određenog rasta stupnja motorizacije u Ličko-senjskoj županiji, u odnosu na prošlu godinu.

Od ostalih značajnijih sredstava su sredstva koja su u iznosu od 993.018,00 kn uprihodovana temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

Svi ostali prihodi od manjeg su značaja i uglavnom su ostvareni koliko su i planirani.

Realizacija Financijskog plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini utemeljena je na:

a) Programu izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana i plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu, donesenom od strane Upravnog vijeća na temelju čl. 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije („Županijski glasnik" broj 1/06), na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10.12.2018. godine, Klasa:400-02/17-01/04, Ur.br.:2125/1-09/18-02-35.
b) Odluci ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2017. godini, a realizirana su u 2018. godini.
c) Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za održavanje i rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini.

2.) RASHODI I IZDACI – OPĆI DIO

2.1. ANALIZA RASHODA POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2018. GODINU

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018.
1	2	3	4	5	6	7
				UKUPNI RASHODI	**35.135.500,00**	**34.784.974,00**
3				**Rashodi poslovanja**	**32.542.500,00**	**32.324.510,00**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**2.096.000,00**	**2.067.240,00**
		311		Plaće (Bruto)	1.755.000,00	1.730.841,00
			3111	Plaće za redovni rad	1.755.000,00	1.730.841,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	42.650,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	42.650,00
		313		Doprinosi na plaće	298.000,00	293.749,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.000,00	264.715,00
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	29.033,00
	32			**Materijalni rashodi**	**25.552.500,00**	**25.374.402,00**
		321		Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	64.098,00
			3211	Službena putovanja (cestarina i ostalo)	20.000,00	18.020,00
			3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.000,00	33.979,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	9.175,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.924,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	170.500,00	119.371,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00	23.912,00
			3223	Energija (el. energija, motorni benzin, dizel i pelete)	110.000,00	81.826,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.225,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	12.408,00
		323		Rashodi za usluge	25.110.000,00	25.019.793,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000,00	39.353,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.476.000,00	24.441.977,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja i oglasi	45.000,00	28.437,00
			3234	Komunalne usluge	23.000,00	22.717,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge (ostalo)	230.000,00	225.349,00
			3238	Računalne usluge	120.000,00	90.860,00
			3239	Ostale usluge (troškovi vođenja naplate cestarine)	170.000,00	171.101,00
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0
			3241	Naknade ostalih troškova	0	0

		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	171.140,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	82.000,00	81.680,00
			3292	Premije osiguranja	23.000,00	19.989,00
			3293	Reprezentacija	20.000,00	9.297,00
			3294	Članarine	17.000,00	16.385,00
			3295	Pristojbe i naknade	32.000,00	32.322,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.468,00
	34			**Financijski rashodi**	**604.000,00**	**595.700,00**
		343		Ostali financijski rashodi	604.000,00	595.700,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	11.544,00
			3433	Zatezne kamate	0	0
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi (slivna vodna naknada, ostalo)	589.000,00	584.156,00
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.290.000,00**	**4.287.169,00**
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.290.000,00	4.287.169,00
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste Grad Gospić	4.290.000,00	4.287.169,00
4				**Rashodi za nabavu nefinacijske imovine**	**2.593.000,00**	**2.460.463,00**
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**
		412		Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00
			4122	Koncesije	1.000,00	1.000,00
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.592.000,00**	**2.459.463,00**
		421			2.583.000,00	2.450.638,00
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.583.000,00	2.450.638,00
		422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	8.825,00
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00

2.) RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

2.1. ANALIZA RASHODA POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 2018.
0001	**RASHODI I IZDACI**	**35.135.500**	**34.784.974**
A 01	Glavni program ŽUC-e Ličko-senjske županije		
0100	**Redovni rashodi - uprava i admin.**	**8.134.500**	**7.951.264**
A 101	**Rashodi za zaposlene**	**2.096.000**	**2.067.240**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*2.096.000*	*2.067.240*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.096.000**	**2.067.240**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.096.000**	**2.067.240**
311	Plaće (Bruto)	1.755.000	1.730.841
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000	42.650
313	Doprinosi na plaće	298.000	293.749
A 102	**Naknade troškova zaposlenicima**	**78.000**	**64.098**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*78.000*	*64.098*
3	**Rashodi poslovanja**	**78.000**	**64.098**
32	**Materijalni rashodi**	**78.000**	**64.098**
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000	64.098
A 103	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.500**	**119.371**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*170.500*	*119.371*
3	**Rashodi poslovanja**	**170.500**	**119.371**
32	**Materijalni rashodi**	**170.500**	**119.371**
322	Rashodi za materijal i energiju	170.500	119.371
A 104	**Rashodi za usluge**	**693.000**	**637.722**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*693.000*	*637.722*
3	**Rashodi poslovanja**	**693.000**	**637.722**
32	**Materijalni rashodi**	**693.000**	**637.722**
323	Rashodi za usluge	693.000	637.722
A 105	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**0**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*0*	*0*
3	**Rashodi poslovanja**	**0**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**0**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0
A 106	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**194.000**	**171.140**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici i Prihodi od nefinancijske imovine		*194.000*	*171.140*

3	**Rashodi poslovanja**	**194.000**	**171.140**
32	**Materijalni rashodi**	**194.000**	**171.140**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000	171.140
A 107	**Financijski rashodi**	**0**	**0**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		0	0
3	**Rashodi poslovanja**	**0**	**0**
34	**Financijski rashodi**	**0**	**0**
342	Financijski rashodi	0	0
A 108	**Financijski rashodi**	**604.000**	**595.700**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*604.000*	*595.700*
3	**Rashodi poslovanja**	**604.000**	**595.700**
34	**Financijski rashodi**	**604.000**	**595.700**
343	Ostali financijski rashodi	604.000	595.700
A 109	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.290.000**	**4.287.169**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*4.290.000*	*4.287.169*
3	**Rashodi poslovanja**	**4.290.000**	**4.287.169**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste (Grad Gospić)**	**4.290.000**	**4.287.169**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.290.000	4.287.169
K 110	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000**	**8.825**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*9.000*	*8.825*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.000**	**8.825**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000**	**8.825**
422	Postrojenja i oprema	9.000	8.825
0300	**Redovno i izvanredno održavanje**	**24.417.000**	**24.382.071**
A 301	**Redovno održavanje**	**19.434.000**	**19.425.360**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici,Prihodi od HC		*19.434.000*	*19.425.360*
32	**Materijalni rashodi**	**19.434.000**	**19.425.360**
323	Rashodi za usluge	19.434.000	19.425.360
A 302	**Izvanredno održavanje**	**4.983.000**	**4.956.711**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda		*4.983.000*	*4.956.711*
32	**Materijalni rashodi**	**4.983.000**	**4.956.711**
323	Rashodi za usluge	4.983.000	4.956.711
0200	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.584.000**	**2.451.638**

K 201	**Rashodi za nabavu neporizvedene dugotrajne imovine**	**1.000**	**1.000**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici		*1.000*	*1.000*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000**	**1.000**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (koncesije i ostala prava)**	**1.000**	**1.000**
412	Nematerijalna imovina (koncesije)	1.000	1.000
K 202	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.583.000**	**2.450.638**
Izvor financiranja - Opći prihodi i primici, Višak prihoda		*2.583.000*	*2.450.638*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.583.000**	**2.450.638**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.583.000**	**2.450.638**
421	Građevinski objekti (ceste i slični građ. obekti)	2.583.000	2.450.638

2.) RASHODI I

2.2.) IZVRŠENJE PROGRAMA REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

Tablica 1

Šifra posla	Pozicija održavanja na županijskim i lokalnim cestama	Plan za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
1	2	3	4
1.	NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKATA	300.000,00	227.605,00
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	4.600.000,00	4.660.306,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.100.000,00	1.082.620,00
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	400.000,00	409.967,00
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	350.000,00	367.811,00
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTA	650.000,00	634.486,00
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.300.000,00	1.118.746,00
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, tunela ....)	350.000,00	268.665,00
9.	RASVJETA	50.000,00	41.450,00
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	9.634.000,00	9.972.834,00
11.	OSTALI RADOVI	700.000,00	640.870,00
	UKUPNO:	19.434.000,00	19.425.360,00

Rekapitulacija izvršenih radova na redovitom održavanju po vrsti održavanja za 2018. godinu (osnovna podjela ili omjer: Zimsko održavanje/ljetno održavanje).

Planirani trošak izražen po vrsti održavanja	Plan za 2018. godinu	Izvršeno u 2018. godini
a) Zimsko održavanje (zimska služba)		
Ukupno:	**9.634.000,00**	**9.972.834,00**
b) Ljetno održavanje		
Ukupno:	**9.800.000,00**	**9.452.526,00**
A+B Sveukupno:	**19.434.000,00**	**19.425.360,00**

Komentar:

Redovito održavanje cesta dijeli se na ljetno i zimsko održavanje (zimska služba). Vrijeme trajanja zimske službe u jednoj godini u Republici Hrvatskoj podijeljeno je u dva perioda: od 01.01. do 15.04., te od 15.11. do 31.12., a ljetno održavanje započinje 15.04. i traje do 15.11. tekuće godine.

Trošak zimske službe predstavlja za svaku godinu promjenjivu varijablu, pa radovi ljetnog redovnog održavanja ovise o utrošku sredstava redovnog održavanja u zimskoj službi.

Temeljem članka 33. stavak 4. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11.), i sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. br.120/2016), ŽUC-e je provela otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 4 godine (01.06.2017.g. do 31.05.2021.g.). Nakon provedenog postupka javne nabave ŽUC-e je zaključila okvirni sporazum za nabavu radova redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od četiri godine, na iznos od 83.532.128,34 kuna s PDV-om sa izvoditeljem radova „Lika-ceste" d.o.o. Gospić, Smiljanska 41.

Planirana ukupna vrijednost radova za 2018. godinu iznosila je 19.434.000,00 kuna, a vrijednost izvršenih radova je 19.425.360,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva za zimsku službu su 9.634.000,00 kn, a izvršena sredstva za tu namjenu iznose 9.972.834,00 kn, što predstavlja usklađenje aktivnosti u zimskoj službi na cestama u odnosu na klimatske pojave koje su se događale tijekom kalendarske godine na području županije.

Analizom izvršenih radova u 2018. godini na ljetnom redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji zaključujemo da su najznačajnija sredstva uložena u slijedeće stavke:

1. Sanacija asfaltnog i makadamskog kolnika	4.660.306,00 Kn
2. Održavanje opreme ceste	634.486,00 Kn
3. Košnja trave i održavanje zelenila	1.118.746,00 Kn

Sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinom kolnika izvršena je na dionicama cesta čiji je kolnik značajno uništen (deniveliranost, raspucanost >50%, opća oštećenost).

Kod održavanja opreme ceste, određena sredstva utrošena su na zamjenu dijelova (manji broj plašteva) uništene odbojne ograde koja je postavljena na nekim dionicama cesta, a financijski manja sredstva utrošena su na zamjenu oštećene vertikalne signalizacije i redovito obnavljanje horizontalne signalizacije.

Kolnik od kamenog materijala racionalno i redovito je održavan na svim prometno važnijim makadamskim cestama na području županije. Značajna su sredstva uložena u strojno uklanjanje grmlja, šiblja i drveća koje zbog sve slabije naseljenosti ruralnog područja, sve više raste uz ceste na cestovnom zemljištu.

2.3.) RASHODI II

ANALIZA RASHODA - II

TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

Red. br.	Naziv	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
A)	***Obnova kolnika***		
1.	Obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-rotor, L= 800 m	738.000,00	737.081,00
2.	Obnova kolnika LC59001 u Senju, L=cca 700 m	621.000,00	620.812,00
3.	Obnova kolnika ŽC5167 u Udbini, ul. Katedralska L= 570 m	1.270.000,00	1.260.984,00
4.	Obnova kolnika ŽC 5154 i dogradnja nogostupa ul.dr.Ante Starčevića (u Perušiću) L= 580 m	1.352.000,00	1.351.570,00
5.	Obnova kolnika LC 59133 dionica Babić Siča-Zavižan	409.000,00	408.817,00
	UKUPNO OBNOVA KOLNIKA:	**4.390.000,00**	**4.379.264,00**

Red. br.	Naziv	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
B)	***Ostali troškovi izvanrednog održavanja: projektiranje, stručni nadzor, izvlaštenje, parcelacijski elaborati, kontrolna ispitivanja, ostalo***		
	Izrada tehničke dokumentacije sukladno čl. 26. stavak 2. Zakona o cestama („N.N." br.84/2011.)		
1.	Izrada projektne dokumentacije obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-rotor, L=1.100 m	35.000,00	34.937,00
2.	Izrada projektne dokumentacije obnova kolnika LC59069 Tuk Bjelopoljski, te uređenje raskrižja sa D1, L=1.900 m	53.000,00	52.375,00
3.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi kolnika na:		
3.1.	- ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-rotor	15.000,00	13.120,00
3.2.	- LC59001 u Senju, L=cca 700 m	13.000,00	12.416,00
3.3.	- ŽC5167 u Udbini, L=cca 570 m	24.000,00	22.698,00
3.4.	- ŽC5154 i dogradnja nogostupa ul. dr.A.Starčevića (u Perušiću), L=580 m	26.000,00	25.004,00
4.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na obnovi kolnika na:		
4.1.	- ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-rotor	12.000,00	12.000,00
4.2.	- LC59001 u Senju, L=cca 700 m	12.000,00	12.000,00
4.3.	- ŽC5167 u Udbini, L=cca 570 m	7.000,00	7.125,00
4.4.	- ŽC5154 i dogradnja nogostupa ul. dr.A.Starčevića (u Perušiću), L=580 m	8.000,00	7.875,00
5.	Izrada prometnog projekta za smirivanje	15.000,00	15.000,00

	prometa na ŽC 5155 Kosa Janjačka (LC59060)-Perušić (D50), prilaz autocesti		
6.	Izrada tehničke dokumentacije za ojačanje kolničke konstrukcije i zamjena kolničkog zastora na ŽC 5141 dionica od ŽC 5140 do Kutereva, L=cca 2.700 m, B faza	149.000,00	148.750,00
7.	Izrada projekta postavljanje nove prometne signalizacije na ŽC i LC na području županije,ostatak ugovornih usluga	120.000,00	118.625,00
8.	Izrada projektne dokumentacije obnova kolnika postojeće makadamske ceste L59074 dionica D.Štrbci-Štrbački Buk, ostatak ugovornih usluga	88.000,00	87.250,00
9.	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama:- usluge stručnog nadzora LC 59133 dionica Babić Siča-Zavižan, L=cca 2.500 m--usluge koordinatora II na LC59001	16.000,00	8.272,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:	**593.000,00**	**577.447,00**
	SVEUKUPNO TROŠKOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA:	**4.983.000,00**	**4.956.711,00**

2.4.) RASHODI – III

ANALIZA RASHODA - III

TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

Red. br.	Naziv	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
A)	***REKONSTRUKCIJA***		
1.	Rekonstrukcija potpornog zida i rekonstrukcija dijela ŽC 5140 u Krasnu, L=116 m	1.490.000,00	1.484.900,00
	UKUPNO REKONSTRUKCIJA ŽC I LC:	**1.490.000,00**	**1.484.900,00**

Red. br.	Naziv	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
B.)	***Ostali troškovi programa građenja i rekonstrukcije: izrada projektne dokumentacije, procjena zemljišta, otkup zemljišta, izrada parcelacijskih elaborata, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te ostali troškovi***		
1. 1.1.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji: - potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu, L=116 m	38.000,00	37.729,00

2. 2.1.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na rekonstrukciji: - potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu	23.000,00	23.000,00
3. 3.1.	Usluge koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji: - potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu	10.000,00	9.783,00
4.	Kontrolna ispitivanja mosta u Lovincu na LC59113	71.000,00	70.838,00
5.	Troškovi postupka izvlaštenja na ŽC5141 u Kuterevu	780.000,00	675.739,00
6.	Usluge novelacije glavnog i izvedbenog projekta sanacije i prilagodbe raskrižja županijske ceste Ž 5140 sa lokalnom cestom L 59019 (rotor Švica),	27.000,00	27.000,00
7.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC515.	80.000,00	79.375,00
8.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija raskrižja u istom nivou ŽC 5144 i ŽC 5145 ulazak u Sinac	18.000,00	17.962,00
9.	Izrada elaborata procjene zemljišta za rotor Švica na ŽC 5140 i LC 59019	21.500,00	Knjiženo u geodetsko-katastarske usluge
10.	Ostali troškovi na ŽC i LC na području županije Izrada tehničke dokumentacije proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti nove rasponske konstr. mosta Lovinac na LC 59113	24.500,00	24.312,00
11.	Koncesija za potporni zid na ŽC6274 S.Novalja	1.000,00	1.000,00
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	**1.094.000,00**	**966.738,00**
	SVEUKUPNO GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJE:	**2.584.000,00**	**2.451.638,00**

2.5.) RASHODI – IV

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

Red. br.	Naziv	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
1.	- slivna vodna naknada, naplata cestarine, takse	759.000,00	753.057,00
	UKUPNO:	**759.000,00**	**753.057,00**

REKAPITULACIJA RASHODA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Red.br.	VRSTA RASHODA	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
RASHODI – I	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta.....	19.434.000,00	19.425.360,00
RASHODI –II	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.....	4.983.000,00	4.956.711,00
RASHODI -III	Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta.....	2.584.000,00	2.451.638,00
RASHODI -IV	Ostali troškovi na županijskim i lokalnim cestama -slivna vodna naknada, naplata cestarine i uknjižba javnih cesta na području županije.....	759.000,00	753.057,00
RASHODI	Rashodi tekuće pomoći-nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama.....	4.290.000,00	4.287.169,00
	SVEUKUPNO:	**32.050.000,00**	**31.873.935,00**

3) REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. god.

1.	A) PRIHODI	O P I S	Plana za 2018. (kn)	Izvršeno u 2018. (kn)
	1.	**Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila**	12.773.500,00	12.952.345,00
	2.	**Prihodi iz Hrvatskih cesta d.o.o. za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta**		
	2.1.	-za redovito održavanje -za interventne zahvate - Odluka („N.N." br.41/2018) -očekivani prihod od MMPI	1.346.767,00 547.814,00 7.643.027,00 2.600.000,00	1.346.767,00 547.814,00 7.643.027,00 9.671.965,00
	3.	**Ostali prihodi**		
	3.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.404,00	28.626,00
	3.2.	Naknada za izvanredni prijevoz	2.000,00	0
	3.3.	Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste	2.000,00	0
	3.4.	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	988.863,00	993.018,00
	3.5.	Naknada za obavljanje pratećih poslova	5.000,00	7.350,00
	3.6.	Prihodi po posebnim propisima	16.000,00	28.717,00
	3.7.	Prihod od kamata	6.000,00	385,00
	3.8.	Ostali prihodi: sufinanciranje sa lokalnom samoupravom i ostalim		

		pravnim subjektima	433.585,00	631.613,00
		UKUPNO PRIHODI:	**26.395.960,00**	**33.851.627,00**

2.	**B) RASHODI**	**O P I S**	**Plana za 2018. (kn)**	**Izvršeno u 2018. (kn)**
	1.	Rashodi poslovanja ŽUC-e (rashodi ustanove)	3.085.500,00	2.911.039,00
		-rashodi za zaposlene -materijalni rashodi -financijski rashodi -rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	2.096.000,00 991.000,00 15.000,00 9.000,00	2.067.240,00 823.430,00 11.544,00 8.825,00
	2.	-Rashodi redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta	19.434.000,00	19.425.360,00
	3.	-Rashodi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	4.983.000,00	4.956.711,00
	4.	-Rashodi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	2.584.000,00	2.451.638,00
	5.	-Ostali rashodi	759.000,00	753.057,00
		-slivna vodna naknada i takse -troškovi za vođenje naplate cestarine	589.000,00 170.000,00	584.156,00 168.901,00
	6.	Rashodi tekuće pomoći unutar općeg proračuna-nerazvrstane ceste prema Zakonu o cestama	4.290.000,00	4.287.169,00
		SVEUKUPNO RASHODI :	**35.135.500,00**	**34.784.974,00**

Grafički prikaz strukture rashoda
Županijske uprave za ceste
u 2018. godini (izvršenje)

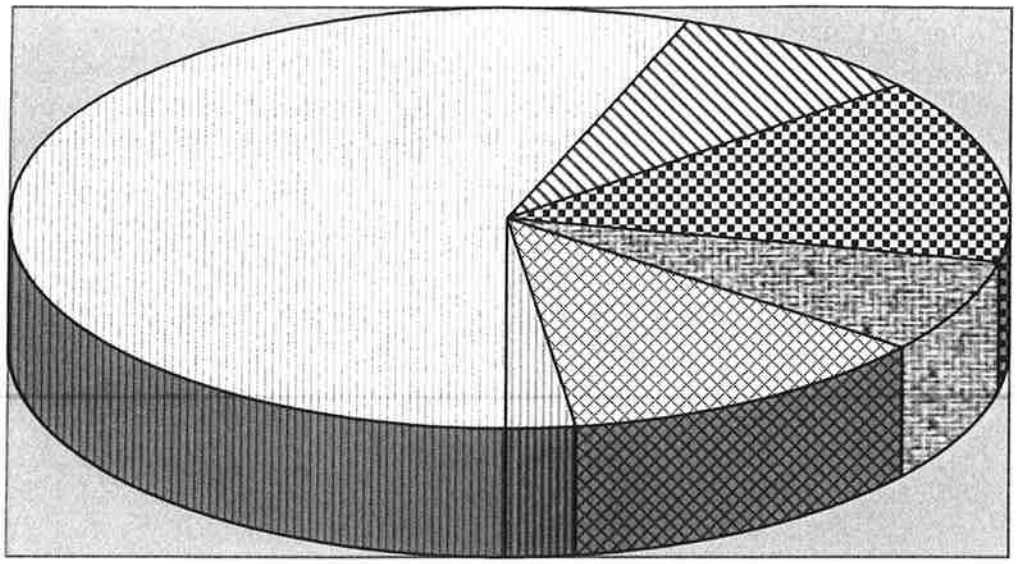

- redovno održavanje cesta (55,85%)
- rashodi poslovanja Ustanove ŽUC-e (8,37%)
- izvanredno održavanje cesta (14,25%)
- građenje cesta (7,05%)
- rashodi tekuće pomoći prema Zakonu o cestama:Grad Gospić (12,32%)
- ostali rashodi- slivna vodna naknada, ostalo (2,16%)

Komentar:

Ostvareni prihodi za 2018. godinu iznose 33.851.627,00 kuna. Za 2017. godinu bilježe se potraživanja u iznosu od 2.110.570,00 kuna, koja se prvenstveno odnose na nepodmirene obveze od strane „Hrvatskih cesta" koja iznose 1.894.581,00 kuna, potraživanja od sufinanciranja lokalnih samouprava u iznosu od 211.585,00 kuna i potraživanja za najam prostorija u iznosu od 4.404,00 kuna. Potraživanja od strane „Hrvatskih cesta" za 2017. godinu u iznosu od 1.894.581,00 kuna su podmirena do trenutka pisanja ovog Izvješća o radu.

Realizirani rashodi za 2018. godinu iznose 34.784.974,00 kune. Ostvareni višak prihoda za 2018. godinu iznosi 7.806.192,00 kuna. Razlog ovog neplaniranog ostvarenog prihoda, odnosno viška prihoda je donošenje Odluke o dodijeli sredstva županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018., dana 18.12.2018., pred sam kraj godine, a sa ciljem realizacije istih u 2019. godini. Za određenu pripremu tehničke dokumentacije postupak nabave obavljen je tijekom 2018. godine, pa se u skladu sa dinamikom rješavanja iste od strane nadležnih državnih tijela, završetak određenih usluga planira izvesti u 2019. godini.

Iz navedene realizacije vidljiva je uz izvođenje radova i aktivnost pripreme projektne dokumentacije na temelju koje se može pronalaziti najprihvatljiviji model financiranja svakog projekta, uz mogućnost uključivanja i lokalne samouprave. Priprema projektne dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju cesta je vrlo složen i obiman posao, čija realizacija, kao i proteklih godina, ovisi o nizu pravnih subjekata koji sudjeluju u postupku izdavanja pojedinih dokumenata. Hodograme i gantograme takvih projekata vrlo je teško precizirati, pa je i vrijeme trajanja ukupnog ciklusa realizacije dugotrajno.

Završni komentar:

Analizirajući strukturu i količinu radova izvršenih na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije, utvrđuje se porast ulaganja u radove izvanrednog održavanja u odnosu na primjerice 2015. i 2016. godinu, ali i smanjenje takve vrste ulaganja u odnosu na 2017. godinu. Izvorni prihodi Županijske uprave za ceste, bilježe određeni kontinuirani rast iz godine u godinu, ali isti nije dovoljan da bi se osigurala dodatna ulaganja u poboljšanje cestovne mreže. Tako je prihod iz resornog ministarstva ključan u osiguranju potrebnog standarda održavanja i osiguranju dodatnih ulaganja na mreži. Tijekom 2018. godine nije donijet Pravilnik o rasporedu sredstava županijskim upravama za ceste u prvoj polovici godine, kakva je bila praksa u proteklim godinama, već su se sredstava uprihodovala na temelju pojedinačnih Odluka resornog ministarstva, od kojih je posljednja bila u prosincu 2018. godine.

U skladu sa tako raspoređenim sredstvima i sa izrađenim prioritetima izvršena je asfaltna obnova kolnika najoštećenijih, prometno važnijih dionica cesta na području županije: na ŽC 5167 u Udbini, Katedralska ulica, obnova kolnika ŽC 5166 u Sv. Roku dionica D 50- rotor, obnova kolnika i dogradnja nogostupa ŽC 5154 sa lokalnom samoupravom u ul.dr. Ante Starčevića u Perušiću i uređenje dionice LC 59001 u Senju.

U programu građenja i rekonstrukcije izvršena je rekonstrukcija potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu..

Nastavljeno je kao i prošlih godina kontinuirano ulaganje u održavanje mreže prometnica na području "Parka prirode Velebit", kroz radove redovnog održavanja. Kroz radove zimskog redovnog održavanja održana je protočnost i sigurnost prometa na 1.138 km županijskih i lokalnih cesta. Izvođenjem radova ljetnog redovnog održavanja sprječava se daljnje propadanje kolničke konstrukcije i osigurava se osnovna i opća sigurnost sudionika u prometu.

Bez obzira na velike potrebe, kontinuirano kao i proteklih godina, ali u značajno manjem obimu, nastavili su se radovi na razvitku i zaštiti mreže županijskih i lokalnih cesta u skladu s raspoloživim sredstvima, imajući u vidu postavljene ciljeve, te stvarne i specifične gospodarsko-prometne prioritete cestovne mreže na području Ličko-senjske županije, i to kroz provedbu:

- općeg redovnog zimskog i ljetnog održavanja cesta (radovi redovnog održavanja), sa posebnim naglaskom na obnovi najkritičnijih dionica kolnika, zamjena dijelova oštećene odbojne ograde, sanacija potpornih zidova, rješavanje odvodnje i slično.
- obnove kolnika i objekata i modernizaciju makadamskih cesta u cilju postizavanja potpune povezanosti stanovništva županije modernim asfaltnim kolnicima.
- trajnog kvalitetnog rekonstruiranja dionica cesta u urbanim zonama u skladu sa propisanom projektnom dokumentacijom, postizavanje tzv. „uličnog profila".
- daljnjeg kontinuiranog razvitka tzv."Velebitskih cesta" u cilju definiranja i revitalizacije osnovne mreže na Velebitu.
- sustavnog i kontinuiranog ulaganja u cestovnu infrastrukturu koja opslužuje turističke, kulturne i gospodarske destinacije po kriteriju prometne opterećenosti.

Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je donijela Vlada RH dana 11. svibnja 2017. godine, definirana je različitost društveno-gospodarskih prilika po pojedinim županijama. Specifične okolnosti u pojedinim regijama Hrvatske su vrlo kompleksne i zahtijevaju sustavni pristup definiranju razvojnih potreba u tim regijama. Razvitak infrastrukture predstavlja preduvjet društveno-gospodarskog razvoja, a u sklopu toga optimalna razvijenost županijskih i lokalnih cesta ima vrlo važnu pokretačku ulogu.

Specifična obilježja pojedinih regija, prema kojima se i razvitak županijskih i lokalnih cesta mora uskladiti, poglavito su:

• područja pogođena ratom koja karakterizira loša poduzetnička aktivnost, gubitak tradicionalnih tržišta, depopulacija i spori povratak stanovništva, specifične poteškoće brdsko-planinskih područja u pogledu geografske i prometne izoliranosti, nemogućnost plasmana roba u modernom tržišnom gospodarstvu, nepovoljna starosna struktura stanovništva i sl.,

• potreba za uravnoteženim održivim razvojem otoka, uvažavajući pri tome prirodnu i kulturnu baštinu s razvojnim potencijalom tih područja što određuje pristup rješavanju prometne politike otoka,

• pogranična područja na kojima treba osposobiti mrežu županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta da mogu opsluživati unutarnje kapacitete, kako bi lokalno stanovništvo s obje strane granice moglo zajednički prepoznati i razviti projekte od interesa za društveni i gospodarski razvitak tih područja,

• područja industrijskih zona i zona malog i srednjeg poduzetništva koja se prostorno i prometno moraju kvalitetno integrirati s tranzitnim prometnim pravcima.

Održivi razvitak cesta zadovoljava potrebe današnjice, a da pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. On osigurava ravnotežu između zahtjeva za unapređenje kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ravnomjeran razvitak zemlje i dobrobit svih žitelja (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnje i buduće generacije (sastavnica očuvanja okoliša). Ulaganja u cestovnu infrastrukturu imaju dugoročan karakter, čiji se efekti, bilo pozitivni ili negativni, odražavaju u dugom vremenskom razdoblju te se strateške odluke o daljnjem razvitku cestovne infrastrukture moraju temeljiti na znanstvenim i stručnim istraživanjima i uzajamnoj suradnji struke i politike.

Obzirom da se kod velikog broja županijskih i lokalnih cesta naše županije još prilikom davne izgradnje nisu primjenjivali svi potrebni osnovni tehnički uvjeti građenja, u narednim godinama takvo stanje određuje ulaganja u neriješene sustave odvodnje, ojačanja kolničke konstrukcije, dogradnju bankina, sanaciju potpornih zidova, propusta i mostova, novu opremu ceste, a u ovisnosti o financijskim sredstvima i pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste, kao i potpune rekonstrukcije u skladu sa prometnim, gospodarskim i društvenim potrebama stanovništva Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije na 5. sjednici održanoj 29.03.2019. godine donijelo je Izvješće o radu županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018.godinu.

Klasa: 400-02/17-01/04
Ur.br: 2125/1-09/19-02-38
Gospić, 29.03.2019.

RAVNATELJ

mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE GOSPIĆ

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ernest Petry, dilp.iur.
